

資料 3

工事の実施状況について (排水管敷設工事、貯留槽改良工事)

工事の実施状況について

排水管敷設工事

◆目的


- ・地下水位上昇を抑制するため、植栽帯等を対象に有孔管の整備を行なう。

◆背景

- ・これまでの地下水管理システムの運用を通じて、降雨により植栽帯など一部区域で一時的に地下水位が高くなりやすい箇所が見えてきた。
- ・より効率的な地下水管理を行うため、令和3年度に地下水位上昇抑制対策（有孔管の整備）を6街区の一部で試行し、効果が確認できた。

◆工事実施状況

- ・7街区にて、令和5年3月に完了
- ・6、7街区西側において、令和5年度末から6年度にかけて実施予定

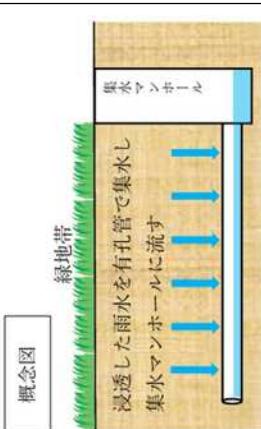

概念図

◆工事実施状況

- ・5、7街区について、令和5年8月に完了
- ・6街区について、令和6年2月に完了予定



貯留槽増設後の様子(5街区)

有孔管敷設
(R3.9完了)

有孔管敷設
(R6年度予定)

揚水井戸
送水管
建物下揚水施設
貯留槽
建物下送水管
有孔管
排水処理施設

