第３回協議会報告事項の概要

平成２５年５月２１日
中央卸売市場

１　土壌汚染対策工事の概要

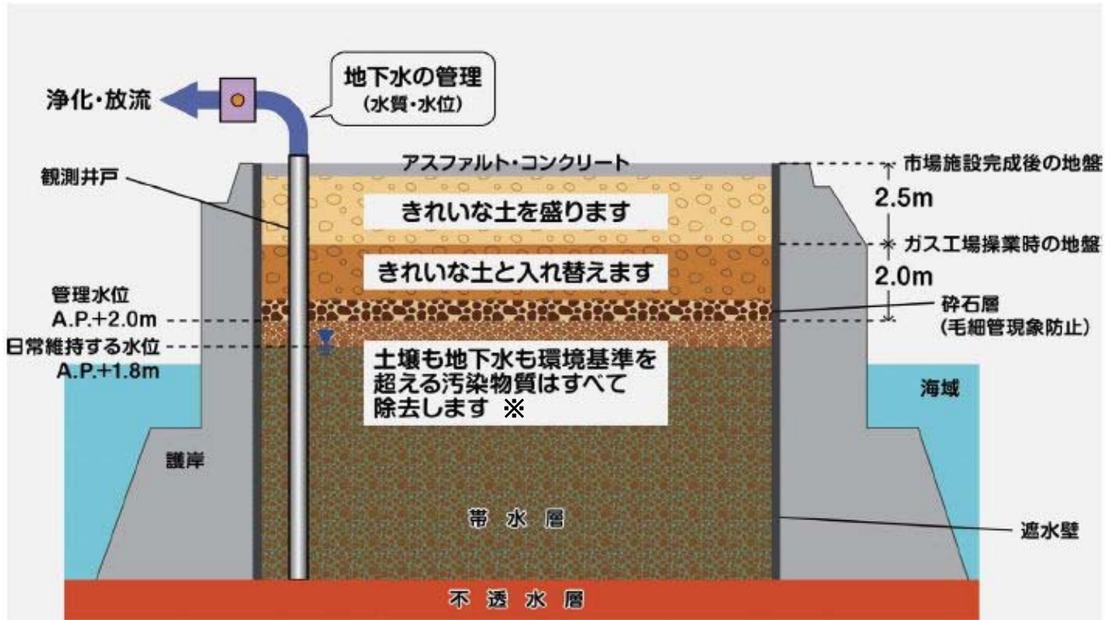

※ 汚染物質は、ガス工場操業由来の汚染物質を対象（７物質）

２　土壌汚染対策工事の流れ

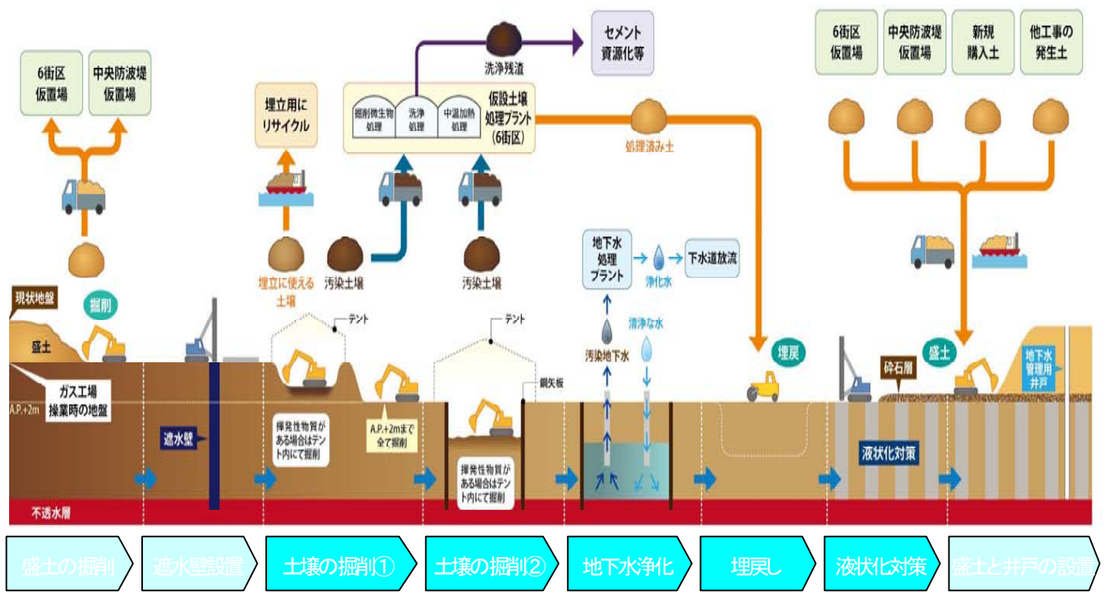

３　土壌・地下水の対策状況

・５、７街区は、土壌の約８割で対策に着手し約６割で完了
　地下水の約７割で対策に着手し、約５割で完了
・６街区は、プラント処理を行うとともに、順次対策を実施

①　土壌の対策状況（４月末時点）

	５街区	６街区	７街区
予定箇所	２８５	２５２	２３４
実施箇所	２１９（77%）	２３（9%）	１７７（76%）
完了箇所	１３９（49%）	１３（5%）	１７５（75%）

②　地下水の対策状況（４月末時点）

	５街区	６街区	７街区
予定箇所	４６１	４３１	４０５
実施箇所	２９６（64%）	２８（6%）	３０５（75%）
完了箇所	１３４（29%）	０（0%）	３００（74%）

４　処理・対策等の結果

・処理済土、地下水、排水ともに、基準以下であることを確認

①　土壌のプラント処理結果（処理済土検体数）

	掘削微生物	洗　浄	中温加熱	計
第１回報告	３	１	５	９
第２回報告（累計）	６４	４６７	４９３	１０２４
今回（累計）	１８９	８２７	８４２	１８５８

②　地下水対策結果

汚染地下水を清浄な水に入れ替える対策、汚染土壌の掘削に合わせて汚染地下水をくみ上げる対策により、地下水浄化（４３４箇所）を完了

③　公共下水道への排水結果

雨水及びプラント処理水ともに、全て基準以下を確認
