

平成29年11月6日(月)  
13時00分から

## 第22回 新市場建設協議会資料

### 資料1 豊洲市場への移転時期の調整について（依頼）

（平成29年10月16日付29中新管第348号）

<参考>

- ・豊洲市場への移転に向けた各種準備作業に関するスケジュール(案)
- ・豊洲市場への移転及び築地市場跡地のオリンピック・パラリンピックの活用に向けたスケジュール(案)

### 資料2 豊洲市場への移転について

新市場建設協議会  
委員各位

新市場建設協議会会長  
中央卸売市場長  
村松 明典

豊洲市場への移転時期の調整について（依頼）

日頃より、中央卸売市場の事業運営に多大なご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、豊洲市場への移転につきましては、去る 9 月 16 日に開催いたしました新市場建設協議会におきまして、「平成 30 年の 6 月上旬から秋にかけて」移転に向けた環境が整う旨をお示しいたしました。

都としては、追加対策工事の着実な実施により豊洲市場の安全性を更に高め、専門家会議による確認や、農林水産大臣の認可を経た上で、可能な限り早期に豊洲市場への移転を実現したいと考えております。

そのためには、早期に移転予定時期を定め、移転準備や新たな市場の運営に向けた様々な調整を進めていく必要があります。

つきましては、今月中の開催を予定している次回の新市場建設協議会におきまして、別紙の内容をお諮りし、移転時期について結論を得たいと考えておりますので、各委員におかれましては、それぞれの団体内での意見集約に向けて、ご協力いただきますよう、よろしくお願い致します。

## 豊洲市場への移転時期について（案）

## （移転時期について）

- 都としては、追加対策工事を着実に実施し、遅くとも平成 30 年 7 月末までには、専門家会議の確認を完了させる見込みである。
- これに加え、農林水産大臣の認可等の手続や、「夏場は避けてほしい」といった業界要望を考慮すると、約 1 年後の平成 30 年の 9 月から 10 月を目途として移転時期を定めたい。
- 時期の調整に際しては、円滑な引越しに必要な 1 週間程度の調整期間（引越後の予備期間）を設けることを考慮する必要がある。
- 豊洲市場への円滑な移転を実現し、都民に対する生鮮食料品の安定的な供給という、中央卸売市場としての使命を一層果たして参りたい。
- また、移転後、10 月から築地市場の解体工事に着手し、オリンピック・パラリンピック大会の運営に必要な環状第 2 号線地上部道路や輸送拠点の整備についても、支障なく対応できることから、是非ともご理解、ご協力をお願いしたい。

## （追加対策工事について）

- 追加対策工事については、適切に契約手続を進め、専門家会議の確認も含めて、遅くとも平成 30 年 7 月末までには完了する予定であり、秋の移転には支障は生じない見込みである。

## （安全・安心、風評被害払拭に向けた取組について）

- 豊洲市場は現在でも、法的・科学的に安全であり、追加対策工事でさらに安全性を高めていくこととしている。
- これに加え、農林水産大臣認可手続が完了すれば、手続き面も含めた安全面での条件が整うことから、その段階で、開設者として、しかるべき発信を行う。
- その間、市場見学会や各種イベント、様々な場面を通じた情報発信など、風評被害払拭に向け精力的に取り組んでいく。


⇒以上の内容で 10 月末を目途に新市場建設協議会を開催し、移転時期（できれば具体的な移転日）について、合意を得たい。

# 豊洲市場への移転に向けた各種準備作業に関するスケジュール(案)

	平成29年度						平成30年度								
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
造作工事		造作相談室強化	造作相談室 運営												
	造作工事の内容によって伸縮する場合あり														
	新規工事施工例 (水仲1店舗) ※未申請の場合	造作相談等	申請	承認	施工計画	施工	完了検査	消防検査	衛生検査						
習熟訓練		受入体制	個別業者による訓練の実施(申請時に随時対応)												
							全体訓練?								
引越準備	引越準備委員会(基本計画・実施計画検討)				タイムスケジュール検討・引越事業者説明等										
					引越相談室設置	引越相談室の運営									
	・個別業者				引越業者選定・契約						移転分散の期間 (事前引越・廃棄物処理)				
各種調整	街区検討会・協議会 (年度内は優先度の高い事項を中心に調整)						街区検討会・協議会								
	主な検討事項 ・施設管理に関する各種ルールの策定 警備体制、入退場管理、清掃・ごみ処理、喫煙、見学者対応 など ・入場車両登録、駐車場割当など、物流関係の調整 ・使用指定エリアと使用者の確定 ほか						調整事項(策定ルール等)の試行など								
事業者の取引関係等	<b>【年内対応が必要な事項】</b> ・業務用カレンダー作成 ・年賀状による移転案内等			<b>【その他の事項】</b> ※実施時期は、各事業者の意向による。 ・移転の案内(産地や小売りなどの取引先に対する移転先、時期等の通知) ・移転に伴う法人登記の変更手続きの準備 ・帳票類をはじめとした事務用品等(住所入りの印刷物、印鑑等)の準備等											

市場移転(豊洲市場の開場)

豊洲市場への移転及び築地市場跡地のオリンピック・パラリンピックの活用に向けたスケジュール(案)

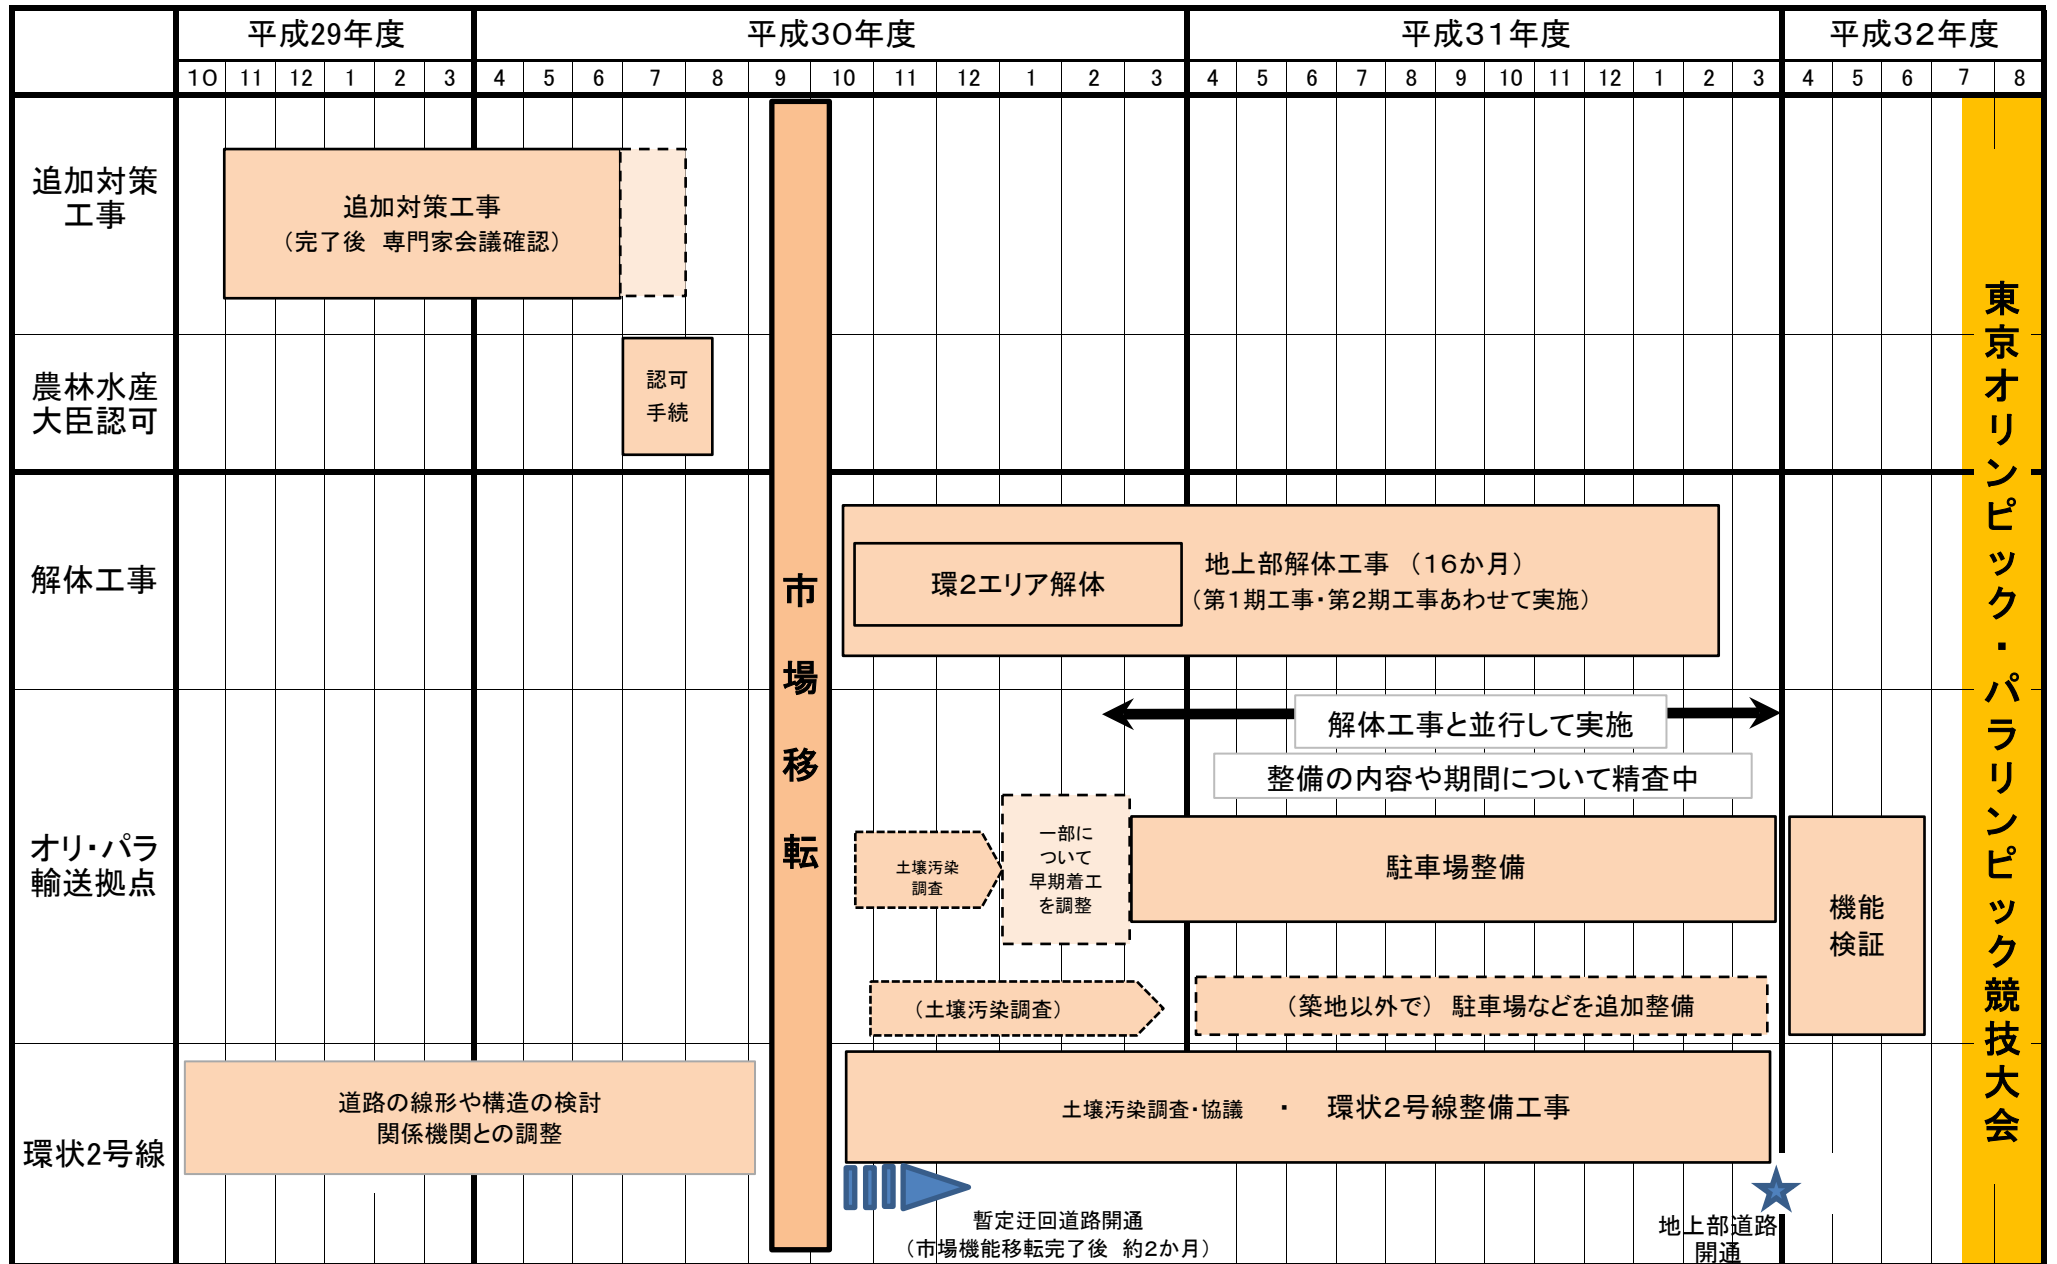

東京オリンピック・パラリンピック競技大会

(注)追加対策工事のスケジュールは、専門家会議の確認を含めて平成30年6月末(遅くとも7月末)に完了予定。

## 豊洲市場への移転について

- ・ 豊洲市場への移転・開場時期については、平成30年10月中旬とする。
- ・ 具体的な期日については、本日の新市場建設協議会での議論を踏まえて定める。
